


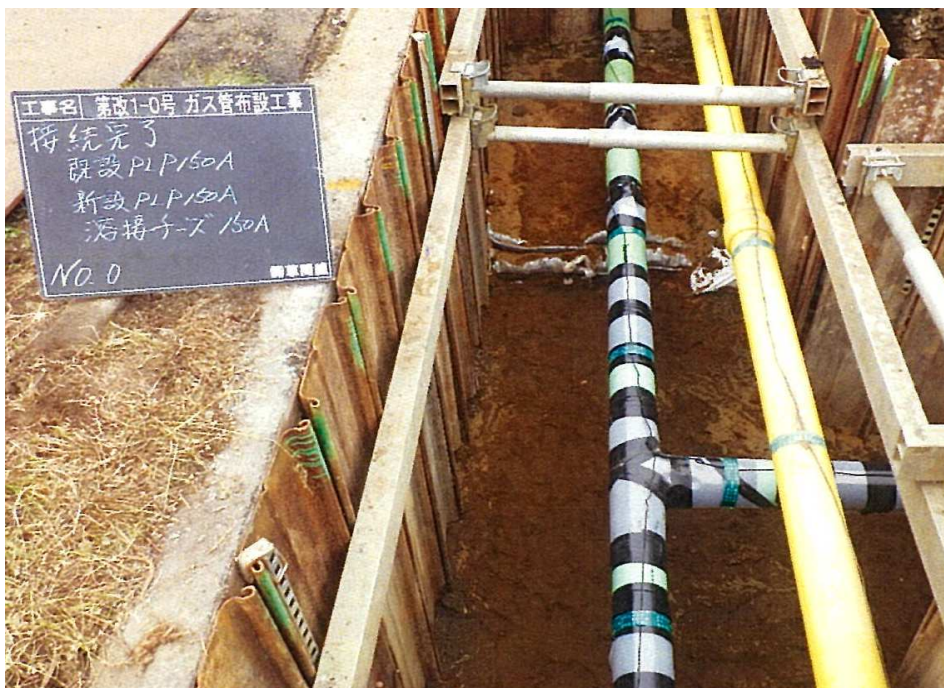

- 施 工 業 者      株式会社 草間組
- 工 事 名          ガス管布設工事
- 工 事 場 所      上越市頸城区下米岡他地内
- 工 事 概 要      ガス管本設    PLP150A    L=21.5m  
                                         GP150A    L=6.3m
- 優良建設技術者  
                         松尾 則昭          (現場代理人・主任技術者)

#### ○ 選 定 理 由

本工事は、ガス流量計室新設工事により、中圧ガス管の布設を行う工事である。

事前調査により現場の地下水位が高いことが判明したため、仮設電源を利用した昼夜常時排水を提案し、作業効率を維持することで、関連する建築工事に対して影響なく、工事を進めることができた。

工事の時期が農繁期と重なることから、地元との調整を積極的に行い、農作業に支障がないよう敷鉄板による迂回路を設置するなど、地元への対応が非常に丁寧に行われ、工事による地元への影響を最小限に抑えることにより、苦情やトラブルが発生することなく、円滑に工事を進めることができた。
